

Fach-Beiträge

- **Revision 7 des LgBestMod 1.1: Ausblick, Planungen, Termine (GeoBremen)**
- Erfassung von Bordsteinen und Entwässerungsrinnen: Diskussionsstand (SB-Lüneburger Heide)

Aktuelle Planung und Termine (1/4)

Zusammenführung der Planungen
für LISA LM 2024 und LISA 3



In den Entwicklungsstellen LISA (NLBL und GeoBremen) wurde eine **grundlegende Änderung in der Projektplanung für LISA LM** vorgenommen

LISA LM 2024 soll nicht mit dem LgBestMod 1.2
umgesetzt und eingeführt werden

Entscheidung ist
getroffen!
Durchführung im
Gange

zwingende Voraussetzung


Klärung erfolgte
Sitzung mit VertiGIS
am 10.03.2023

Es muss gesichert sein, dass bis zur Ablösung von LISA LM durch ein
neues System bis zum Zeitpunkt der Abkündigung von ArcMap am 01.03.2026
das bisherige LISA LM auf Basis des LgBestMod 1.1 weiter betrieben werden kann

Aktuelle Planung und Termine (2/4)

Hintergründe:

- Die Umsetzung von LISA LM 2024 auf das LgBestMod 1.2 hat sich verspätet
- Zum Abkündigungszeitpunkt von ArcMap (als Basis von LISA LM) derzeit am 01.03.2026 muss ein neues System (LISA 3) eingeführt und die Daten müssen migriert worden sein
- Die (verspätet) Einführung von LISA LM 2024 inklusive Migration von LgBestMod 1.1 auf 1.2 und die dann folgende Einführung von LISA 3 inklusive der dann erforderlichen Migration in den Bundesländern wird in der verbleibenden Zeit bis zum 01.03.2026 als nicht realisierbar eingeschätzt

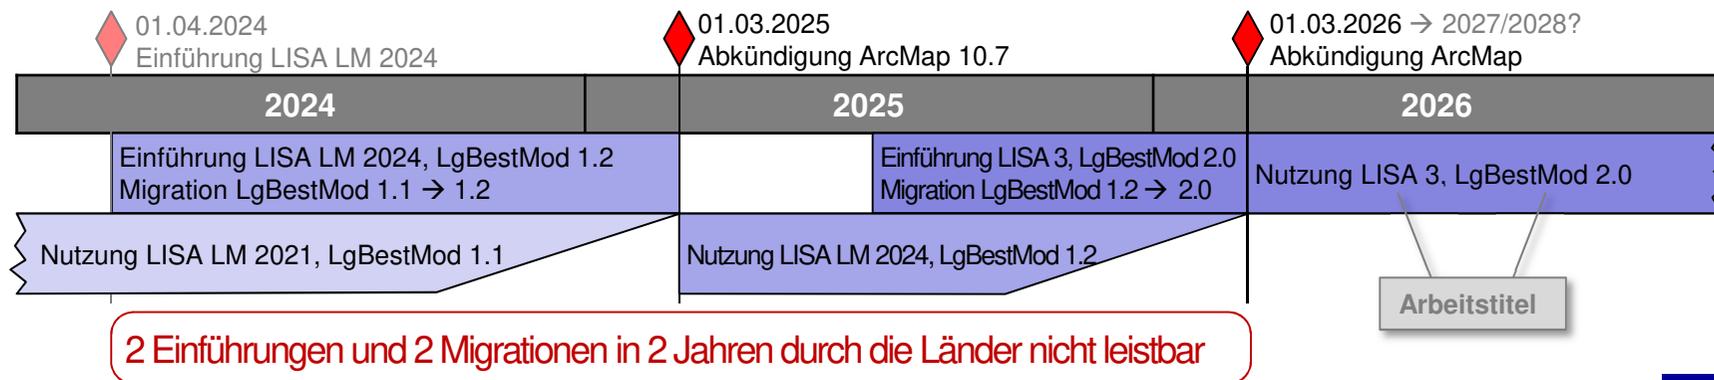

Aktuelle Planung und Termine (3/4)

Konsequenzen für das LgBestMod:

- Die Version 1.2 des LgBestMod kann nicht veröffentlicht werden, da das LISA LM 2024 nicht auf Basis des LgBestMod 1.2 umgesetzt wird
- Die Arbeiten zum LgBestMod 1.2 gehen nicht verloren. Sie werden in das LgBestMod 2.0 übernommen und dann mit LISA 3 eingeführt
- Für LgBestMod 1.1 wird die Revision 07 erstellt, um möglichst alle dringenden Anforderungen aus der Version 1.2 zeitnah (soweit möglich, vorläufig) zur Verfügung zu stellen
- Die prinzipiellen modelltechnischen Grundlagen für das LgBestMod 2.0 sollen sich nicht ändern
- Die Version 1.2 des LgBestMod soll - soweit wie möglich - fertiggestellt
- Bedingt können weitere Anforderungen in der Version 2.0 des LgBestMod umgesetzt werden

Unter der Prämisse den Migrationsaufwand zu minimieren

Aktuelle Planung und Termine (4/4) – Revision 7

- **Q4/2023: Abgabe Arbeitsmittel für Revision 7 an die ES LISA zur Umsetzung von LISA LM 2024**
 - **In Q1/2024: Endredaktion der Revision 7**
 - **In Q2/2024: Erstellung des Katalogwerks für die Revision 7**
-
- **Ende Q2/2024: Freigabe LgBestMod 1.1 Revision 7 gekoppelt mit Freigabe von LISA LM 2024**

Fach-Beiträge.... weiter geht`s

- Revision 7 des LgBestMod 1.1: Ausblick, Planungen, Termine (GeoBremen)
- Erfassung von Bordsteinen und Entwässerungsrinnen: Diskussionsstand (SB-Lüneburger Heide)

TOP 3: Diskussionsrunde

- Einhaltung der VS-NfD-Auflagen
- Fragen, Anregungen: info@liegenschaftsbestandsmodell.de
